



金門縣政府工務處 業務簡報

簡報人：處長 黃儒新

112.4.28.



壹、工務處已完成暨重要計畫執行情形

貳、所督導之單位執行情形

參、今後努力方向

肆、結語



壹、工務處已完成暨重要計畫執行情形



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (1/44)


路平專案計畫

1	環島北路一段（金大路口至頂林路口）道路拓寬暨排水改善工程	完工日 111.07.29
2	環島北路三段（瓊徑路口至高陽路口）道路拓寬工程	完工日 111.12.07
3	環島北路二段道路路平工程	完工日 111.06.30
4	金城－環島西路一段（珠山至吳厝路口段）鋪面改善工程	完工日 111.11.16
5	金湖－成功聚落周邊環島南路三段等道路改善工程	完工日 111.10.11
6	金湖－經武路等道路改善工程	完工日 111.10.31
7	金沙－金沙公墓後側道路破損改善工程	完工日 111.11.29
8	金寧－瓊安路后沙聚落至環島北路二段道路改善工程	完工日 111.10.13
9	烈嶼－上林至西方暨湖下至東崗機場道路改善計畫	完工日 111.06.20
10	烈嶼－卓環國小通學動線提升道路品質計畫	完工日 111.08.11



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (2/44)

★路平專案計畫一覽圖

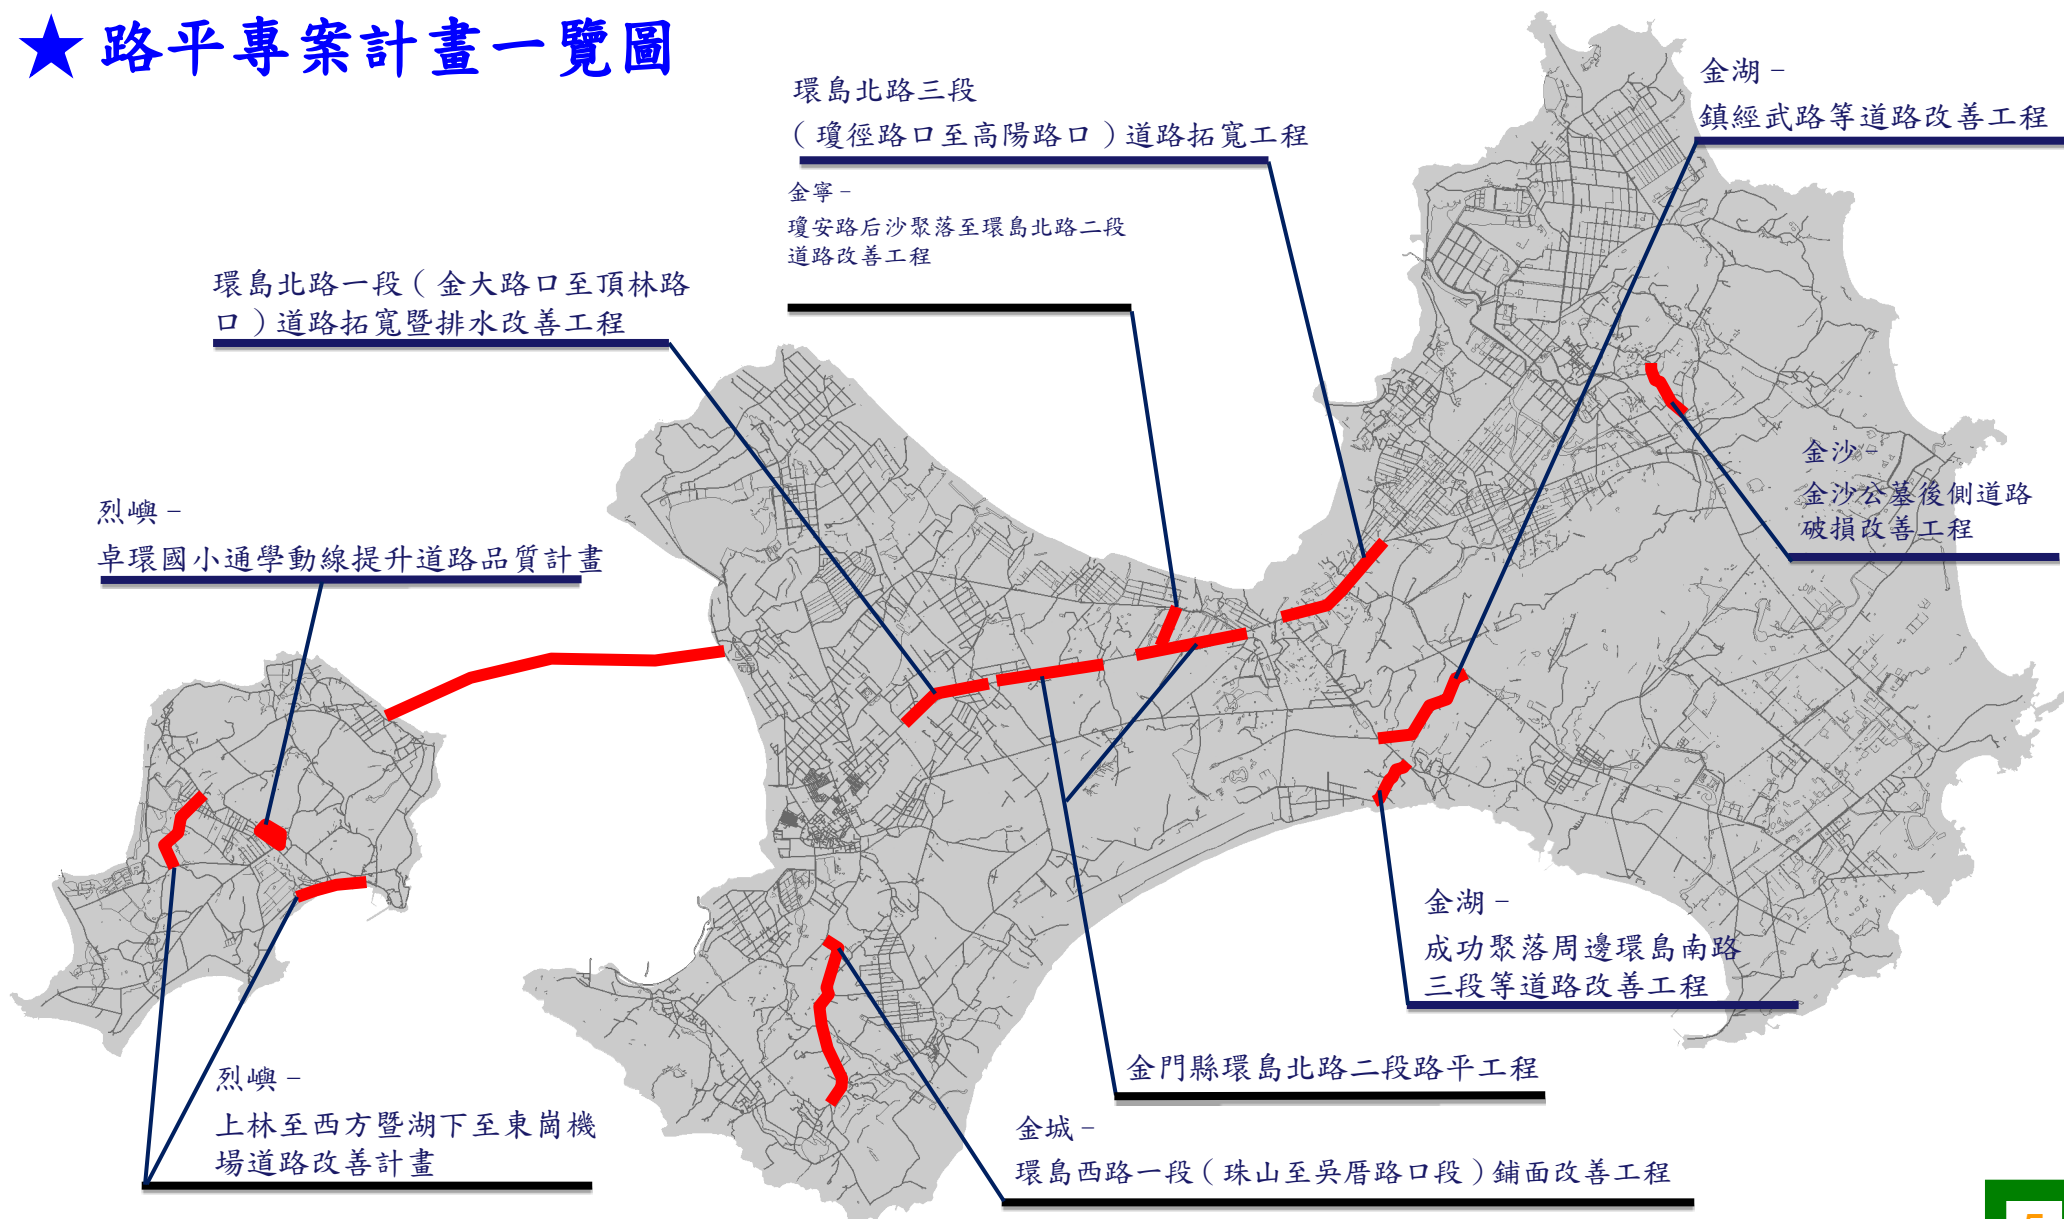






工務處已完成暨重要計畫執行情形 (3/44)

一、工程概要

- 工程名稱 環島北路一段（金大路口至頂林路口）道路拓寬暨排水改善工程
- 完工日期 111 年 07 月 29 日
- 契約金額 4,990 萬元整
- 基地面積（或道路長度） 約 1,400 公尺
- 主要工項 道路、人行道、景觀、共同管溝、照明、標線等工程

二、完工照片

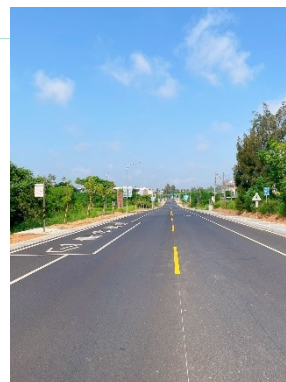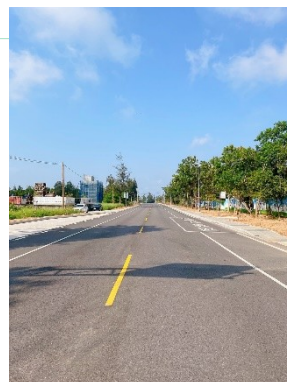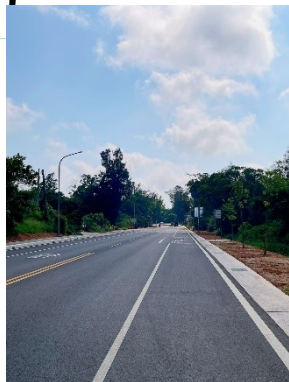




工務處已完成暨重要計畫執行情形 (4/44)

一、工程概要

- 工程名稱 環島北路三段（瓊徑路口至高陽路口）道路拓寬工程
- 完工日期 111 年 12 月 07 日
- 契約金額 6,820 萬元整
- 基地面積（或道路長度） 約 1,700 公尺
- 主要工項 道路、景觀、共同管溝、照明、標線等工程

二、完工照片

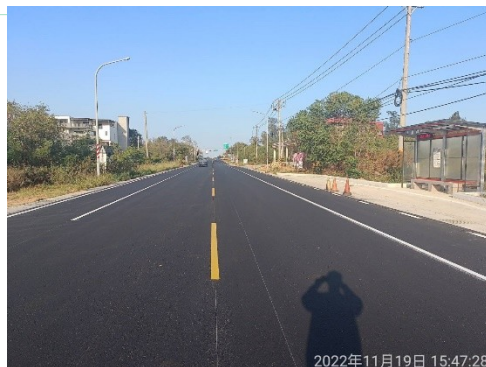




工務處已完成暨重要計畫執行情形 (5/44)

一、工程概要

- 工程名稱 金門縣環島北路二段道路路平工程
- 完工日期 111 年 06 月 30 日
- 契約金額 7,023 萬元整
- 基地面積（或道路長度） 約 3,200 公尺
- 主要工項 道路、景觀、共同管溝、照明、標線等工程

二、完工照片

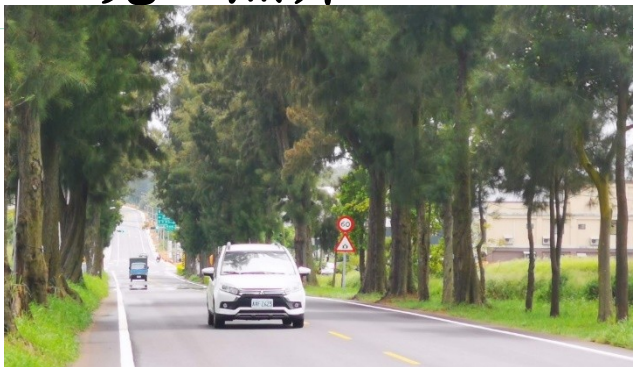




工務處已完成暨重要計畫執行情形 (6/44)

一、工程概要

• 工程名稱	環島西路一段（珠山至吳厝路口段）鋪面改善工程
• 完工日期	111 年 11 月 16 日
• 計畫預算	1,785 萬元整
• 基地面積（或道路長度）	約 2,057 公尺
• 主要工項	道路 AC 刨鋪、路基改善、標線等工程

二、完工照片

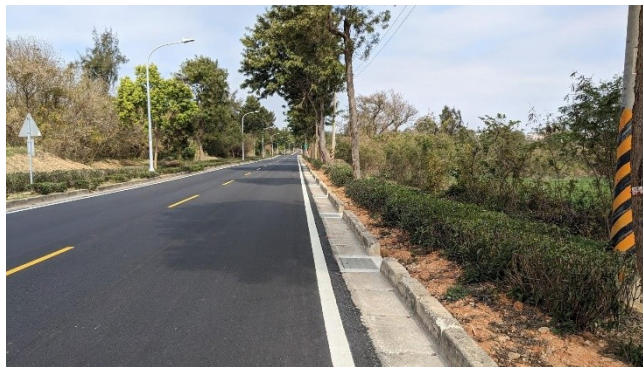



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (7/44)

一、工程概要

- | | |
|----------------|---------------------------|
| • 工程名稱 | 金湖鎮成功聚落周邊環島南路三段等道路改善工程 |
| • 完工日期 | 111 年 10 月 11 日 |
| • 計畫預算 | 1,118 萬元整 |
| • 基地面積 (或道路長度) | 約 1,600 公尺 |
| • 主要工項 | 路基改善、道路 AC 刨鋪、路口道路標線調整等工程 |

二、完工照片






工務處已完成暨重要計畫執行情形 (8/44)

一、工程概要

- | | |
|----------------|-----------------------|
| • 工程名稱 | 金湖鎮經武路等道路改善工程 |
| • 完工日期 | 111 年 10 月 31 日 |
| • 計畫預算 | 1,940 萬元整 |
| • 基地面積 (或道路長度) | 約 1,600 公尺 |
| • 主要工項 | 道路 AC 刨鋪、排水改善工程、標線等工程 |

二、完工照片

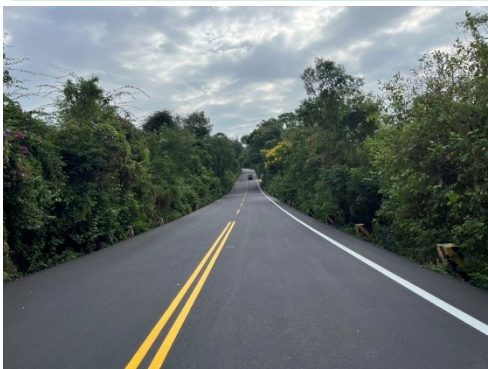



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (9/44)

一、工程概要

- | | |
|---------------|-------------------|
| • 工程名稱 | 金沙鎮金沙公墓後側道路破損改善工程 |
| • 完工日期 | 111 年 11 月 29 日 |
| • 計畫預算 | 813 萬元整 |
| • 基地面積（或道路長度） | 約 1,332 公尺 |
| • 主要工項 | 道路刨鋪工程 |

二、完工照片






工務處已完成暨重要計畫執行情形 (10/44)

一、工程概要

• 工程名稱	金寧鄉瓊安路后沙聚落至環島北路二段道路改善工程
• 完工日期	111 年 10 月 13 日
• 契約金額	1,049 萬元整
• 基地面積（或道路長度）	約 620 公尺
• 主要工項	路面挖除、新作排水暗溝等工程

二、完工照片

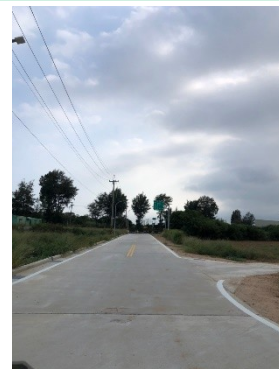



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (11/44)

一、工程概要

• 工程名稱	烈嶼鄉上林至西方暨湖下至東崗機場道路改善計畫
• 完工日期	111 年 06 月 20 日
• 契約金額	2,876 萬元整
• 基地面積（或道路長度）	約 2,315 公尺
• 主要工項	道路刨鋪、台電管路埋設等工程

二、完工照片







工務處已完成暨重要計畫執行情形 (12/44)

一、工程概要

• 工程名稱	烈嶼鄉卓環國小通學動線提升道路品質計畫
• 完工日期	111 年 08 月 11 日
• 契約金額	1,080 萬元整
• 基地面積（或道路長度）	約 464 公尺
• 主要工項	道路刨鋪、新設人行道、人行道改善等工程

二、完工照片

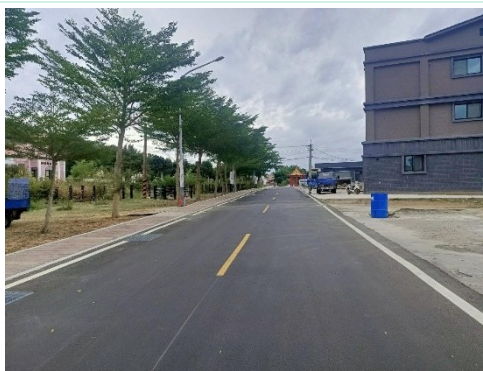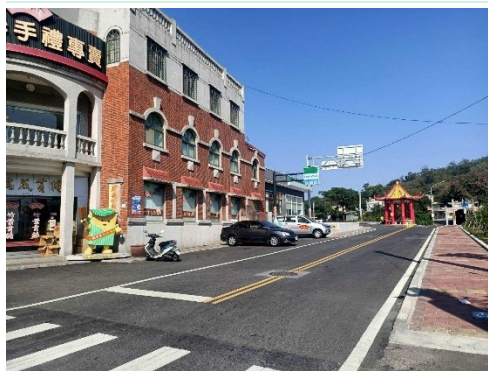




工務處已完成暨重要計畫執行情形

金門大橋 CJ02-2C 標接續工程位置圖

金門大橋 CJ02-2C
標接續工程

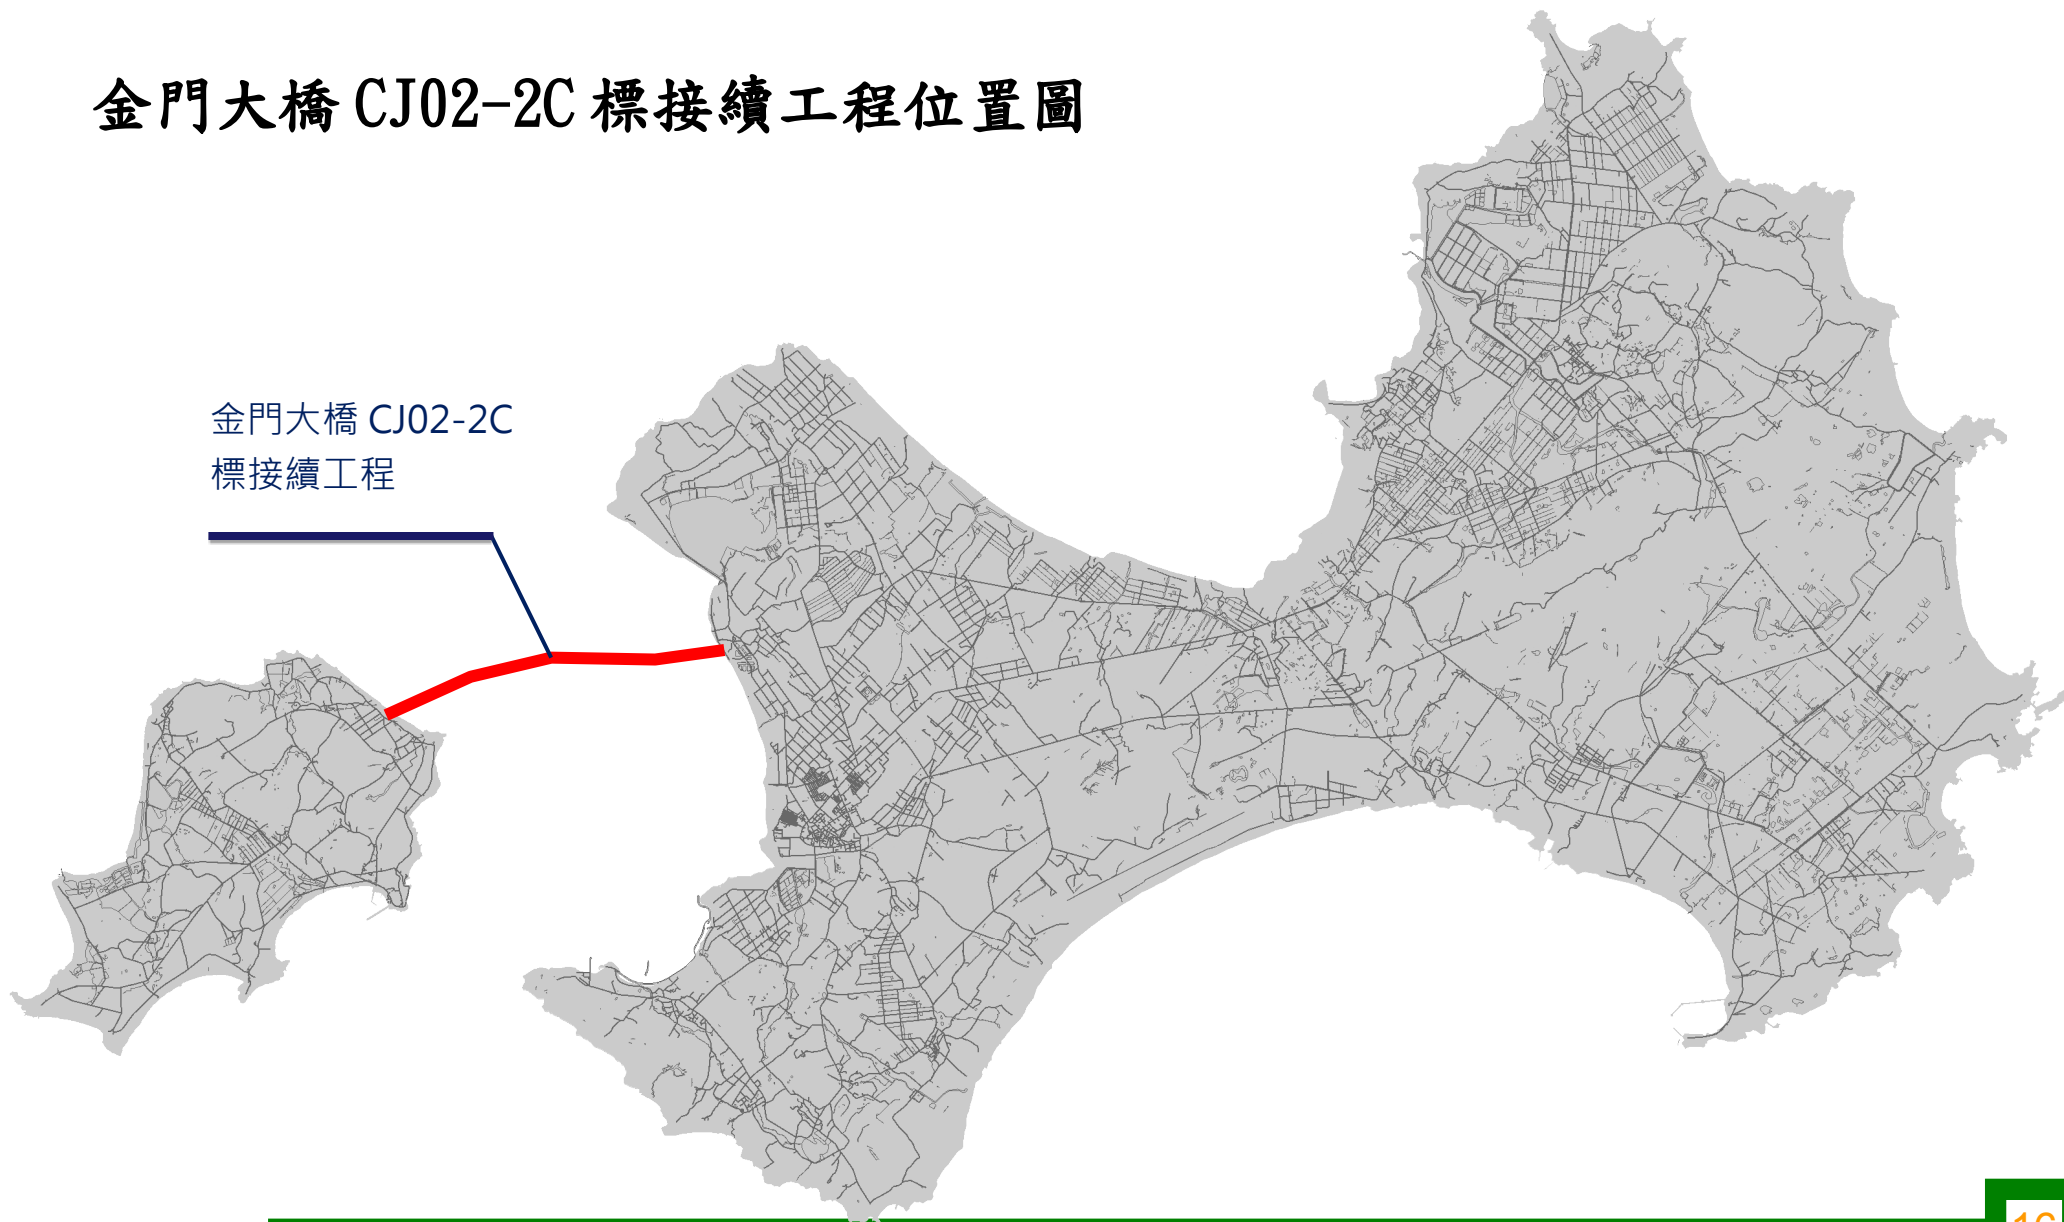





工務處已完成暨重要計畫執行情形

一、工程概要

• 工程名稱	金門大橋 CJ02-2C 標接續工程
• 契約工期	1,804.5 日曆天（含一例一休、颱風停工、處理前標障礙及履約爭議調解結果等展延天數）
• 契約金額	62 億 6,796 萬元（契約變更後）
• 預定完工日期	112 年 01 月 23 日（目前進度 98.83%） 本工程於 111 年 10 月 30 日開放通車
• 工程規模	橋梁全長 4.8 公里（依橋梁位置區分為主橋、邊橋及引橋三部分）

二、施工中照片

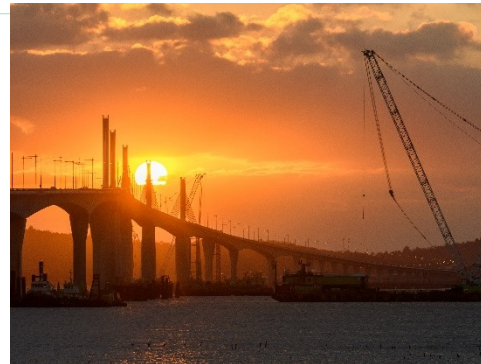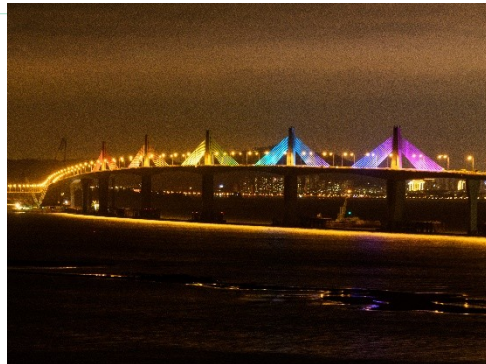



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (15/44)

防洪水利工程 (含前瞻計畫)

1	金沙溪人工湖計畫	預定完工日 114.11
2	金沙溪流域水環境改善工程 (第二期) (龍陵湖)	完工日 112.01.09
3	金門縣山外溪流域優化計畫	預定完工日 112.04.24
4	大膽島北山海岸侵蝕防護應急工程	預定完工日 112.06.02
5	雞鳴山海岸線侵蝕防護工程	完工日 112.01.06
6	金沙抽水站站體及機組設施更新改善應急工程	細部設計中
7	海岸監測及侵淤評估規劃計畫 (烈嶼鄉西側、料羅至水頭)	完工日 111.07
8	海岸監測及侵淤評估規劃計畫 (水頭至古寧頭、古寧頭至馬山、馬山至料羅、大二膽島)	預計 113 年底完成
9	金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程	已完成設計，俟水利署轉正式工程後辦理招標
10	光前溪上游段流域治理工程	已完成設計，俟水利署轉正式工程後辦理招標
11	金門縣浯江抽水站設備提升及改善工程	預定完工日 113.02.01
12	金門縣生態檢核工作計畫 (110-111 年度)	完工日 112.04
13	金門縣政府生態檢核暨相關工作計畫	完工日 112.04
14	金門縣水環境改善整體空間發展藍圖規畫	完工日 112.03
15	金門地區地下水觀測井新建工程	完工日 112.03



★興辦水資源

金沙溪人工湖計畫





工務處已完成暨重要計畫執行情形 (17/44)

一、計畫概要

- 計畫名稱：金沙溪人工湖計畫
- 計畫經費：5.49 億元
- 計畫期程：110-114 年
- 執行情形：委託規劃設計監造案於 110.11.24 訂約，規劃成果於 111.07.27 核定，辦理基本設計作業中，預計 112.10 上網招標。
- 預期效益：預定攔蓄約 200 萬噸水資源，同時亦可滯洪減災。



A photograph of a lush green pond or lake surrounded by dense tropical vegetation and trees under a blue sky with scattered clouds. The water is a murky green color, reflecting the surrounding foliage. The shoreline is lined with various types of trees and bushes, including some tall, thin trees with sparse leaves and others with denser green foliage. The sky is a clear blue with a few white clouds scattered across it. The overall scene is a peaceful, natural landscape.

金沙河流域水環境改善
工程(第二期)(龍陵
湖)



金門縣山外溪流域優化計畫



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (19/44)

一、工程概要

- 工程名稱：金沙溪流域水環境改善工程（第二期）（龍陵湖）
- 開工日期：110 年 08 月 26 日
- 竣工日期：112 年 1 月 9 日
- 契約金額：1,470 萬元整
- 主要工項：攔水堰改建 1 座、攔水堰改善 1 座、浚深 18,226 立方公尺，增加蓄水量 2.1 萬立方公尺。





工務處已完成暨重要計畫執行情形 (20/44)

一、工程概要

- 工程名稱：金門縣山外溪流域優化計畫
- 完工日期：預計 112 年 4 月 24 日（目前進度 95%）
- 契約金額：2,838 萬元整
- 主要工項：增設 MSL 水質淨化處理槽一座、既有排水箱涵重建 154m、埤塘浚深 4,040 立方公尺、改善 4 處污水截流設施

。





工務處已完成暨重要計畫執行情形 (21/44)

★ 防洪水利工程

1. 大膽島北山海岸侵蝕防護應急工程



2. 雞鳴山海岸線侵蝕防護工程



3. 金沙抽水站站體及機組設施更新改善應急工程

4. 海岸監測及侵淤評估規劃計畫 (烈嶼鄉西側、料羅至水頭)


5. 海岸監測及侵淤評估規劃計畫 (水頭至古寧頭、古寧頭至馬山、馬山至料羅、大二膽島)



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (22/44)

一、計畫概要

- 計畫名稱：「前瞻基礎建設計畫水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」(111 年度應急工程)
- 執行工程：大膽島北山海岸侵蝕防護應急工程
- 完工日期：預計 112 年 6 月 2 日完工 (目前進度 85.6%)
- 補助經費：2,500 萬元整
- 預期效益：預計可改善大膽島海岸侵蝕情況。

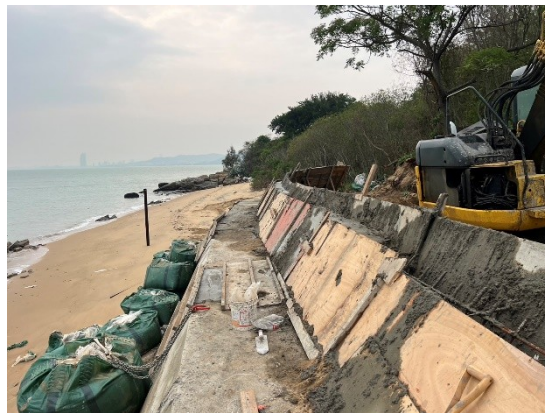



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (23/44)

一、計畫概要

- 計畫名稱：「前瞻基礎建設計畫水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」（111 年度應急工程）
- 執行工程：雞鳴山海岸線侵蝕防護工程
- 完工日期：112 年 1 月 6 日完工結案
- 補助經費：900 萬元整
- 預期效益：預計可改善雞鳴山海岸侵蝕情況，豐富海岸自然生態。





工務處已完成暨重要計畫執行情形 (24/44)

一、計畫概要

- 計畫名稱：「前瞻基礎建設計畫水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」（112 年度應急工程）
- 執行工程：金沙抽水站站體及機組設施更新改善應急工程
- 補助經費：3,136 萬元整
- 預期效益：預計可改善金沙抽水站站內相關設施。





工務處已完成暨重要計畫執行情形 (25/44)

一、計畫概要

- 計畫名稱：「前瞻基礎建設計畫水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」（111 年度規劃案）
- 執行內容：
 - 「金門海岸（料羅至水頭）監測及侵淤評估規劃計畫」
 - 「金門海岸（烈嶼鄉西側）監測及侵淤評估規劃計畫」
- 補助經費：合計 960 萬元整
- 執行效益：已完成該海岸段之測量及觀測調查工作，可作為後續海岸改善之依據。



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (26/44)

一、計畫概要

- 計畫名稱：「前瞻基礎建設計畫水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」（112 年度規劃案）
- 執行內容：
 - 「金門海岸（水頭至古寧頭）評估規劃計畫」
 - 「金門海岸（古寧頭至馬山）評估規劃計畫」
 - 「金門海岸（馬山至料羅）評估規劃計畫」
 - 「金門海岸（大二膽島）評估規劃計畫」
- 補助經費：合計 2,035 萬元整
- 執行效益：預計完成該海岸段之測量及觀測調查工作，可作為後續海岸改善之依據。



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (27/44)

★ 防洪水利工程



3. 金門縣浯江抽水站設備提升及改善工程



金門縣生態檢核工作計畫 (110-111 年)

金門縣政府生態檢核暨相關工作計畫

金門縣水環境改善整體空間發展藍圖規畫

2. 光前溪上游段流域治理工程



1. 金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程





工務處已完成暨重要計畫執行情形 (28/44)

一、計畫概要

- 計畫名稱：「前瞻基礎建設計畫水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」
- 核定工程：
 1. 「金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程」。
 2. 「光前溪上游段流域治理工程」。
- 補助經費：合計 157,675,000 元整
- 預期效益：完善慈湖農莊及金沙地區防洪需求，增加攔蓄水 6,260 立方公尺等。



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (29/44)

一、計畫概要

- 計畫名稱：「前瞻基礎建設計畫水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」
- 執行工程：金門縣浯江抽水站設備提升及改善工程
- 完工日期：預計 113 年 2 月 1 日（目前進度 16.64%）
- 補助經費：54,113,000 元整
- 預期效益：可有效延長既有主要設備或設施使用壽命，提升金城地區排洪能力。



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (30/44)

一、計畫概要


- 計畫名稱：「前瞻基礎建設計畫水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」
- 執行項目：金門縣生態檢核工作計畫（110-111 年度）、金門縣政府生態檢核暨相關工作計畫、金門縣水環境改善整體空間發展藍圖規畫。
- 契約金額：合計 1,565 萬元整
- 預期效益：已完成 6 案基地範圍生物廊道及既有植被調查工作、2 案規劃設計階段生態調查、2 案施工中階段生態調查，及水環境改善整體空間發展藍圖規畫補充之生態調查及水質檢測。



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (31/44)

★ 防洪水利工程

金門地區地下水觀測井新建工程
(全區 13 口)

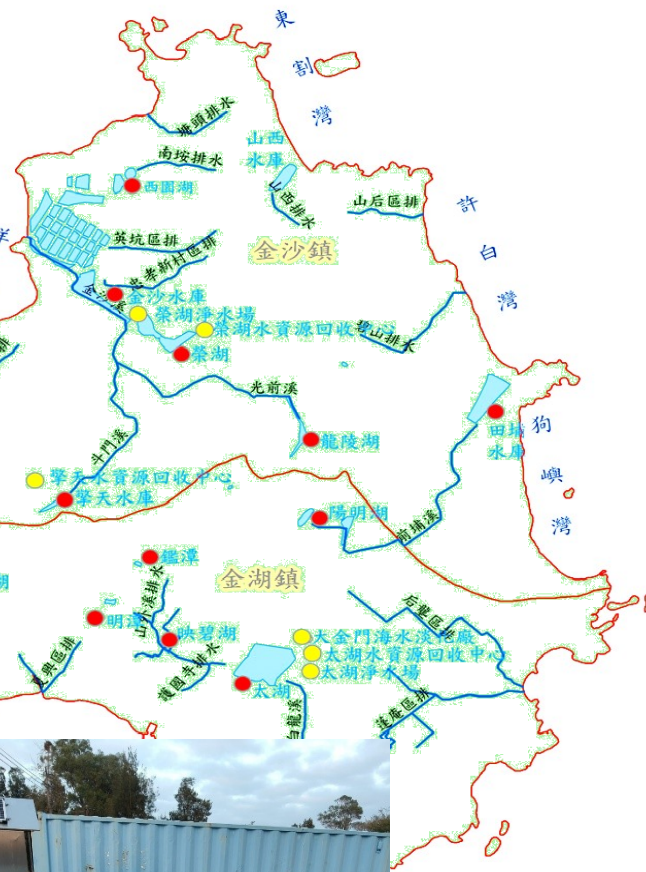



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (32/44)

一、計畫概要

- 計畫名稱：離島地區供水改善計畫（第二期）
- 補助工程：「金門地區地下水觀測井新建工程」
- 完工日期：111 年 12 月 3 日
- 契約金額：2,100 萬元整
- 預期效益：於金門本島增設 13 口地下水觀測井，擴充觀測站網，加強管控地下水位變化。





工務處已完成暨重要計畫執行情形 (33/44)

污水下水道工程		
1	金沙鎮第五標污水下水道及用戶接管工程	預定完工日 112.05.09
2	金沙鎮第六標污水下水道及用戶接管工程	預定完工日 112.08.07
3	金城鎮第六標污水下水道及用戶接管工程	預定完工日 112.10.06
4	金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程	預定完工日 112.12.06
5	烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程	細部設計已完成，營建署核備後辦理招標
6	東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程	細部設計審查會議已完成
7	金門地區零星污水下水道用戶接管工程	預定完工日 112.05.16



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (34/44)

★ 污水下水道工程

- 公共污水下水道接管戶數為 16,755 戶
- 下水道用戶接管普及率為 38.47%

金門水資源回收中心廠站設備及節能(統包)工程

東林水資源回收中心二期擴建工程

烈嶼鄉第四標

金門地區零星污水下水道用戶接管工程

金沙鎮第六標

金沙鎮第五標

金城污水處理廠二期擴建工程

污泥減量乾燥設備工程

金城鎮第七標

金城鎮第六標

金湖鎮第五標



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (35/44)

●金沙鎮第五標

一、工程概要

• 工程名稱：金沙鎮第五標污水下水道及
用戶接管工程

• 完工日期：預計 112 年 5 月 9 日
(目前進度 94.01%)

• 契約金額：12,250 萬元整

• 接管區域：已完成劉澳、浦邊、
下塘頭、呂厝，刻施作長福里，
接管戶數約 259 戶，現已接管 228 戶。






工務處已完成暨重要計畫執行情形 (36/44)

● 金沙鎮第六標

一、工程概要

- 工程名稱：金沙鎮第六標污水下水道及用戶接管工程
- 完工日期：預計 112 年 8 月 7 日
(目前進度 91.78%)
- 契約金額：24,760 萬元整
- 接管區域：已完成高坑，刻施作何厝、斗門、高坑、中蘭、下蘭，接管戶數約 364 戶，現已接管 238 戶。

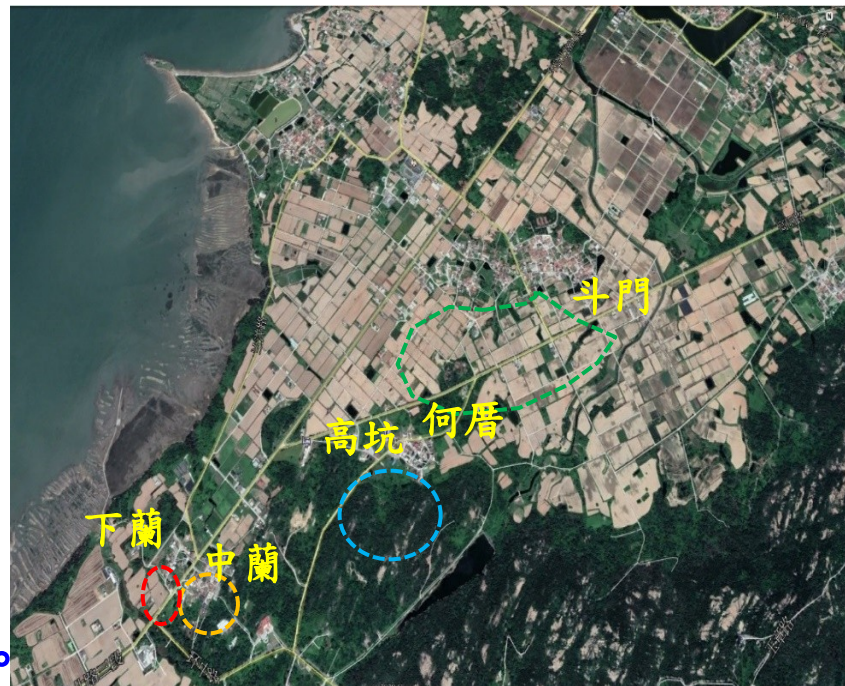




工務處已完成暨重要計畫執行情形 (37/44)

●金城鎮第六標

一、工程概要

- 工程名稱：金城鎮第六標污水下水道及用戶接管工程
- 完工日期：預計 112 年 10 月 06 日
(目前進度 53.78%)
- 契約金額：23,880 萬元整
- 接管區域：已完成東社、東沙，刻施作庵前、吳厝、浴井、山前、官裡、古區，預計接管 376 戶，現已接管 84 戶。

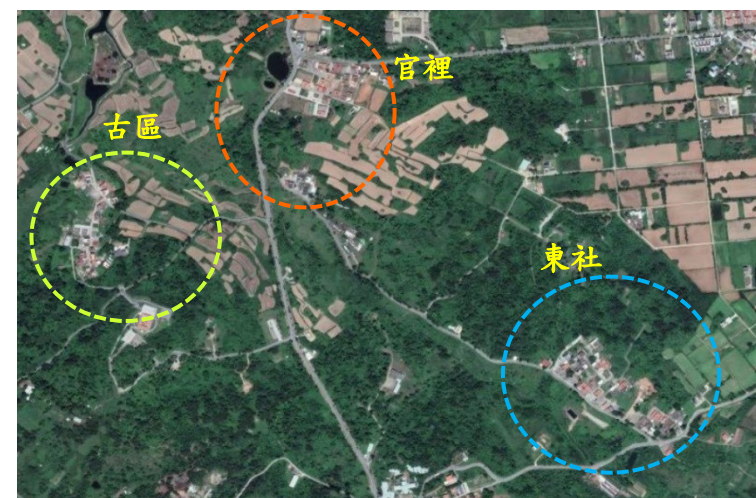



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (38/44)

● 金城鎮第七標

一、工程概要

- 工程名稱：金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程
- 完工日期：預計 112 年 12 月 6 日
(目前進度 72.02%)
- 契約金額：22,680 萬元整
- 接管區域：刻施作金門城、后豐港，
預計接管 462 戶，現已接管 93 戶。






工務處已完成暨重要計畫執行情形 (39/44)

●烈嶼鄉第四標

一、工程概要

- 工程名稱：烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程
- 執行情形：已完成細部設計報告，並於112年3月20日報營建署審查，俟核備後辦理工程發包。
- 預算金額：26,158萬元整
- 接管區域：青岐、庵下、庵頂、后宅、前埔、南塘，預計接管340戶。

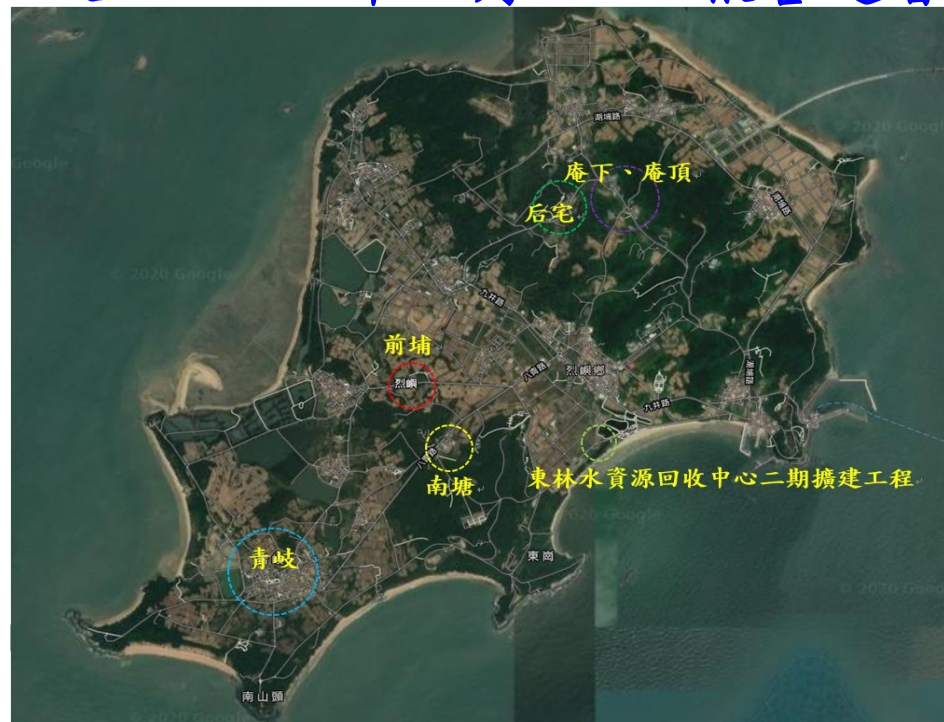



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (40/44)

● 東林水資源回收中心二期擴建工程

一、工程概要

- 工程名稱：東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程
- 執行情形：目前辦理細部設計中，已於 112 年 4 月 19 日完成審查會。
- 預算金額：8,349 萬元整
- 主要工項：原址擴建 600CMD
(全期容量 900CMD)






工務處已完成暨重要計畫執行情形 (41/44)

●金門地區零星污水下水道用戶接管工程

一、工程概要

- 工程名稱：**金門地區零星污水下水道用戶接管工程**
- 完工日期：**預計 112 年 5 月 16 日**
(目前進度 83.47%)
- 契約金額：**2,350 萬元整**
- 接管區域：**針對金城鎮及金寧鄉辦理零星用戶接管工程，預計接管約 90 戶，現已接管 57 戶。**

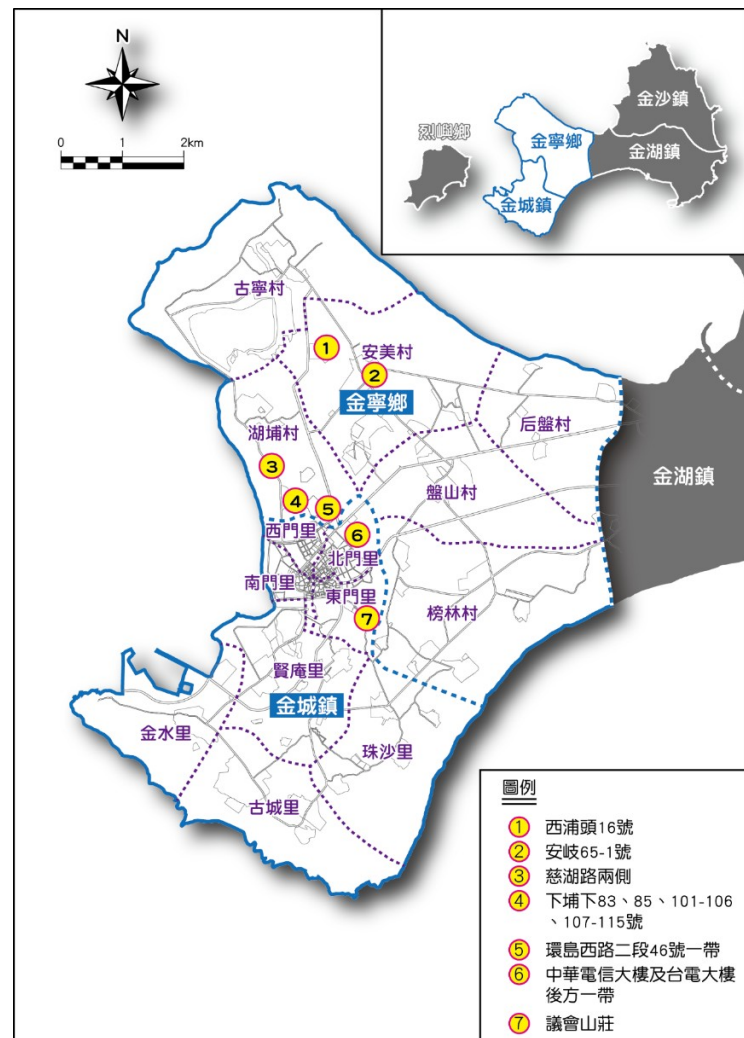



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (42/44)

- 業務內容：本處代辦本縣各機關學校之重大建築工程案，期憑藉專業人力及遵循完善品質管理制度，能有效使地區各建築工程案達到合理之品質及效率，並逐步提昇地區承攬建築工程營造廠商之素質。
- 設計中案件：
 1. 「金門縣警察局金城分局金寧分駐所新建案」預算金額 8,423 萬元，已辦理 3 次招標流標，目前正辦理第 4 次招標。
- 施工中案件：
 1. 「金門縣金湖鎮柏村國民小學行政大樓改建工程」於 110.10.08 決標，110.12.06 開工，目前進度為 67.11%。
 2. 「金門縣何浦國民小學西側校舍新建工程」於 110.11.03 決標，111.01.14 開工，目前進度為 67.95%。



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (43/44)

3. 「金門縣古寧國小行政大樓（活動中心）拆除重建工程」於 110.11.08 決標，111.02.16 開工，目前進度為 53.515%。
 4. 「金門縣立烈嶼國中中央廚房暨烘焙教室新建工程」於 111.01.18 決標，111.02.27 開工，目前進度為 73.091%。
 5. 「金沙國小地下停車場暨複合式體育場館興建工程」於 111.04.11 決標，111.06.08 開工，目前進度為 3.31%。
 6. 「金門縣金沙國中東棟大樓拆除重建工程」於 111.08.25 決標，111.11.01 開工，目前進度為 5.44%。
- 已完工案件：
1. 「金門縣金城鎮賢庵國民小學垵湖分校新建專科教室工程」於 110.11.03 決標，110.12.25 開工，112.02.21 完工，目前辦理驗收作業中。



工務處已完成暨重要計畫執行情形 (44/44)

工程名稱：金門縣金城鎮賢庵國民小學垵湖分校新建專科教室工程（待驗收）

契約金額：1,960 萬元整

工程內容：為地上1樓之建築物，包含專科教室1間、教室1間、另有1間餐廳、廚房與保健室及一般廁所、無障礙廁所等，總樓地板面積為為479.93平方公尺。





貳、所督導之單位執行情形



所督導之單位執行情形 (1/7)

自來水廠－重點工作

瓊安路－環島西路－西浦頭配水塔送水管新建工程

- 配合洋山淨水場清水調度與東水西送政策，自瓊林圓環沿瓊安路、環島西路至西浦頭配水塔，埋設口徑 600mm、400mm、200mm 之送（配）水管。
- 全案分二標進行，第一標工程訂於 112 年 4 月中下旬完工，截至 112 年 4 月 9 日之實際 / 預定進度為 97.3% / 99.3%；第二標工程則於 112 年 4 月 12 日決標。完工後預計可將現有西送水量（9,000CMD）再向上提升。





所督導之單位執行情形 (2/7)

金門跨海橋樑附掛自來水管工程

- 配合興建中之金門大橋，於橋梁箱室及引橋道路分別新建口徑 355mm (HDPE) 與 300mm (DIP) 之送水管。
- 全案於 111 年 12 月 30 日完竣，112 年 1 月 16 日辦理竣工查驗，總計完成 HDPE 約 5,363M、300mmDIP 約 146.5M 以及相關閥件設施。







所督導之單位執行情形 (3/7)

金門大橋兩端送水管及配水池加壓站工程

- 延續金門大橋附掛管線，再於兩端陸域（慈湖路、湖埔路）埋設口徑 200mm、300mm 之送（配）水管，並於大金端新建容量 550 噸之配水加壓站一座。
- 本工程依地區分兩標辦理，均已於 112 年 1 月上旬申報開工，完工後配合附掛管線，有效強化烈嶼地區供水安全性與穩定度。

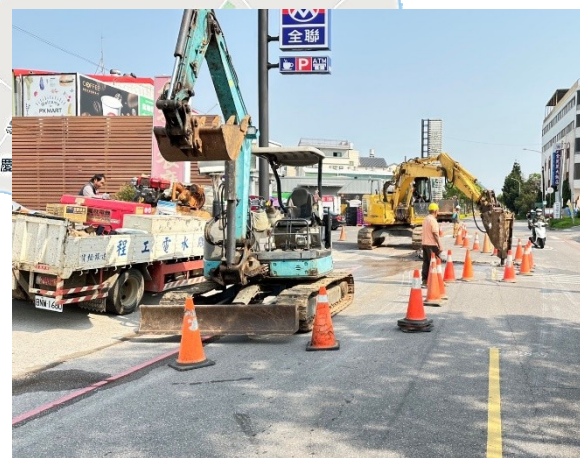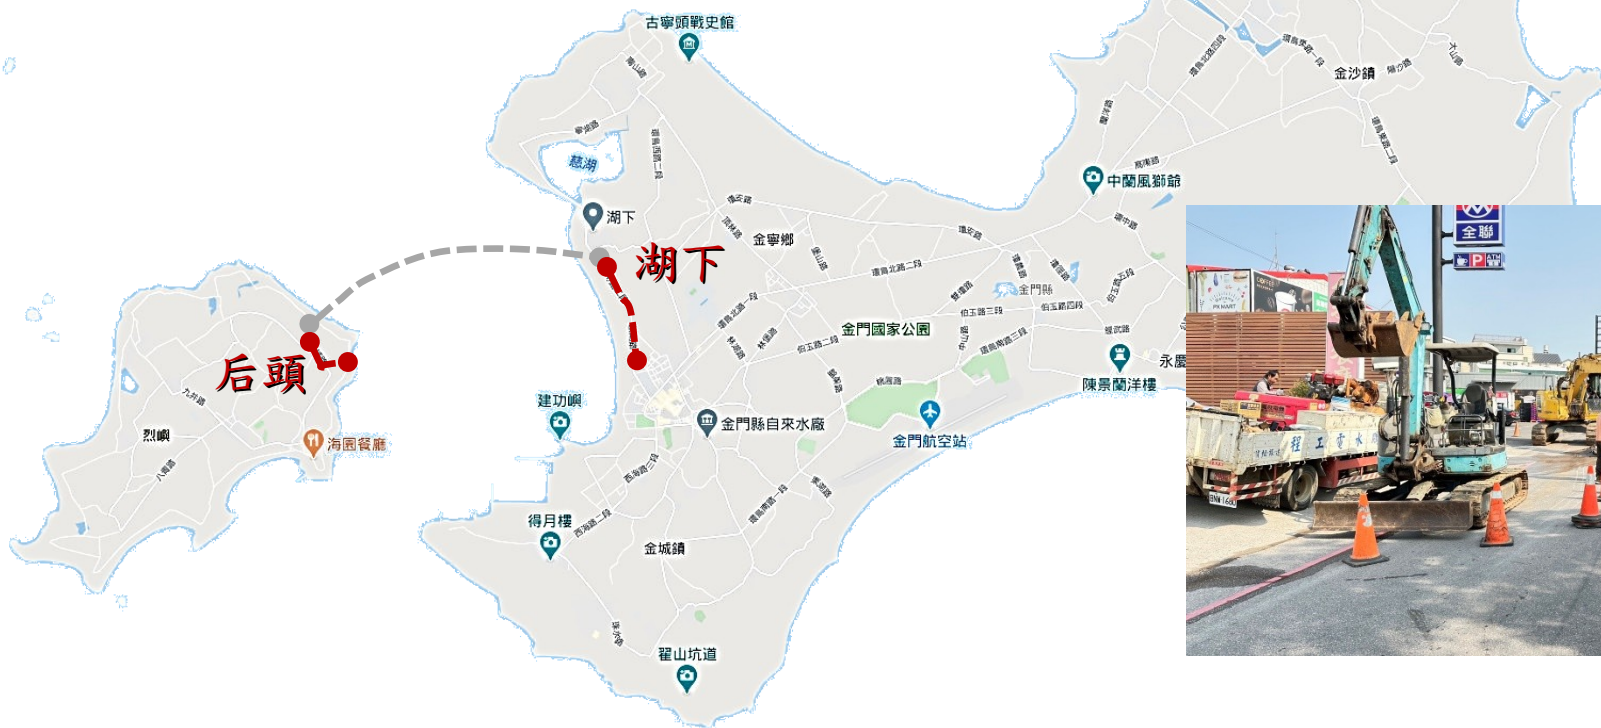




所督導之單位執行情形 (4/7)

養工所 - 重點工作

- 路燈數量截至本 (112) 年 4 月共接管全縣路燈計 17,747 盞

111年10月至112年04月路燈盞數

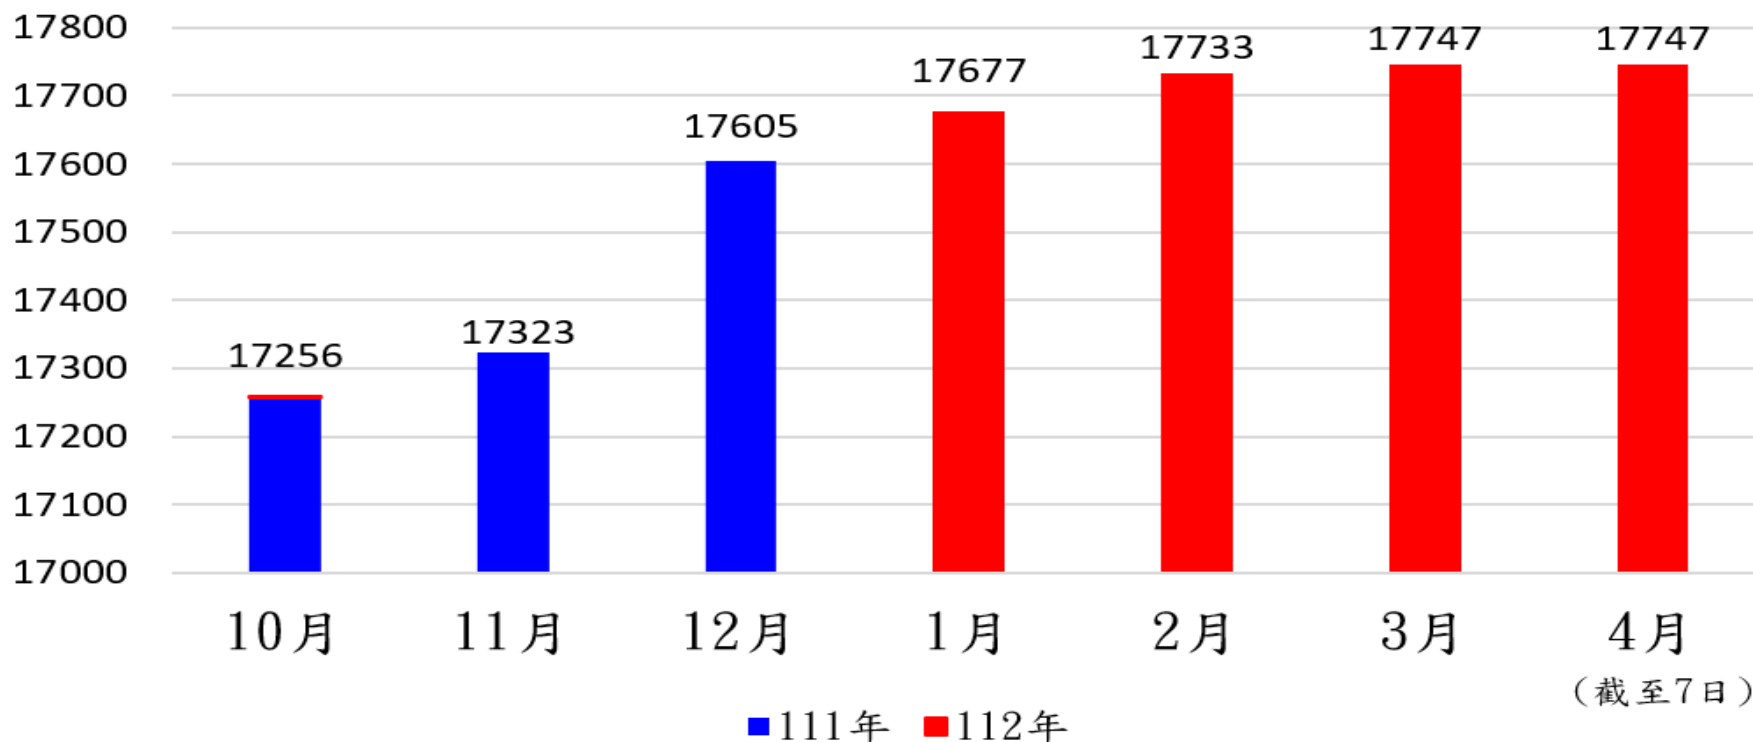




所督導之單位執行情形 (5/7)

□ 土石方管理：

白乳山土資場營建剩餘土石方經核定總收容量為 244,000 m³，截至 112 年 3 月止，進場數量為 196,224.5 m³，外運總量為 102,573 m³，目前暫存數量為 93,651.5m³。

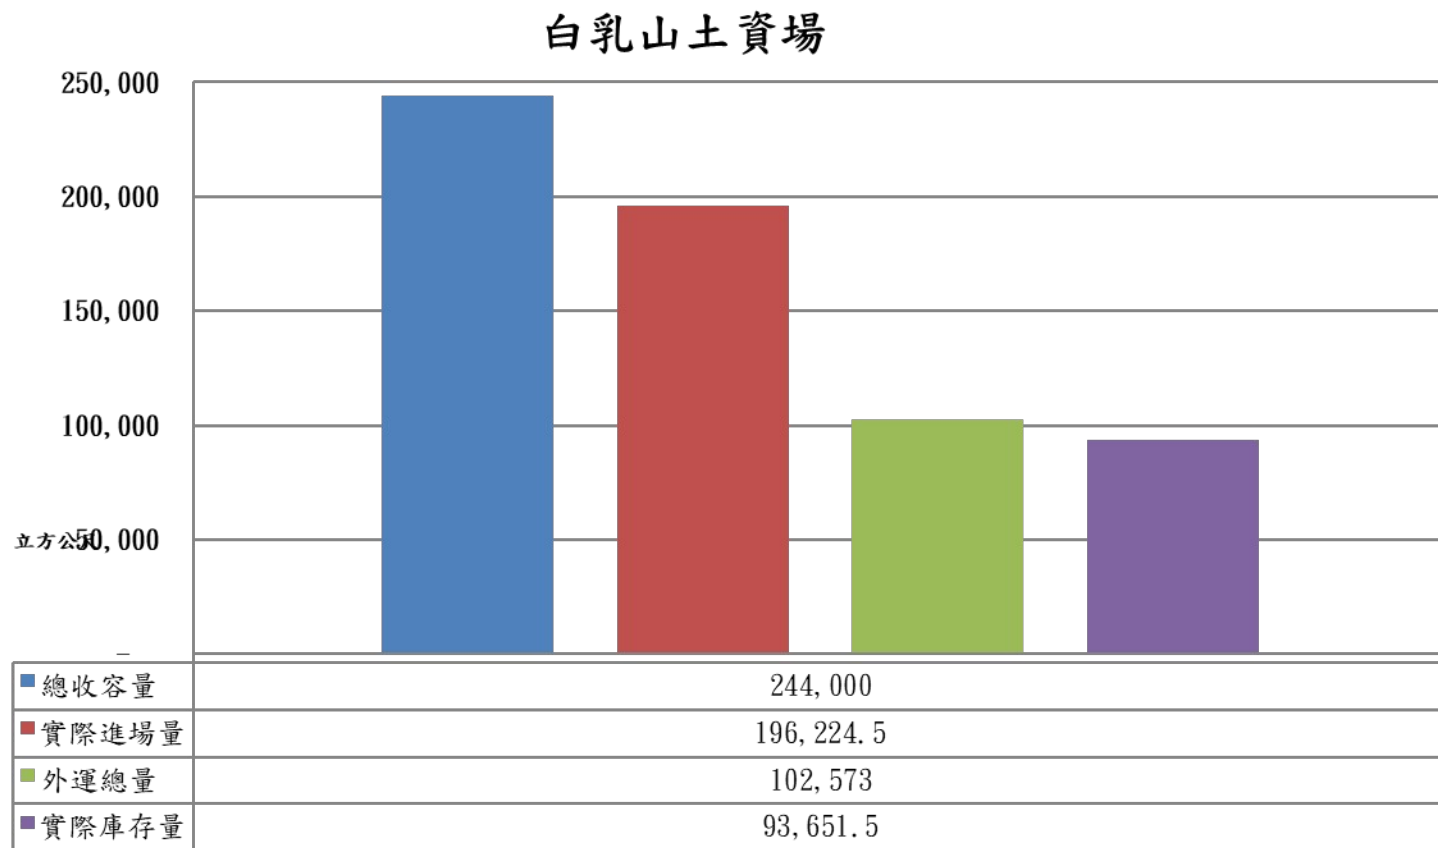




所督導之單位執行情形 (6/7)

- 道路養護：
- 平時定時派員道路路面巡查，111年10月至112年3月止，執行道路坑洞修補117處，其中該所自行巡查110處，自巡發現比率94%，修復面積1360 m²。

道路修復

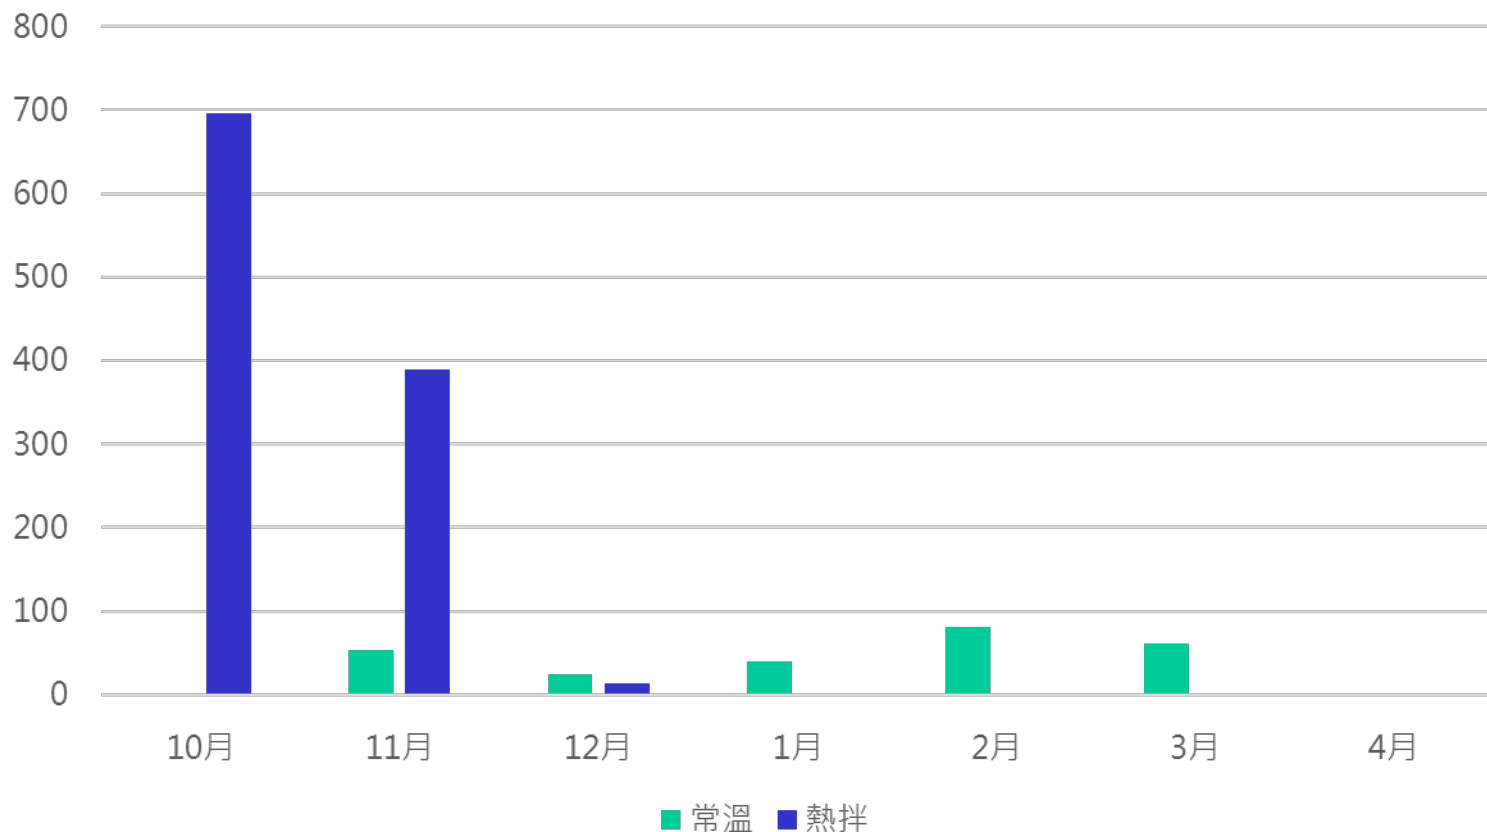




所督導之單位執行情形 (7/7)

□ 水溝清淤：

111 年 10 月至 112 年 3 月止已完成水溝清淤面積 294 m²（盤果路），本所定期派員巡查，如有發現淤積立即排定行程派工，維持水溝暢通不阻塞。

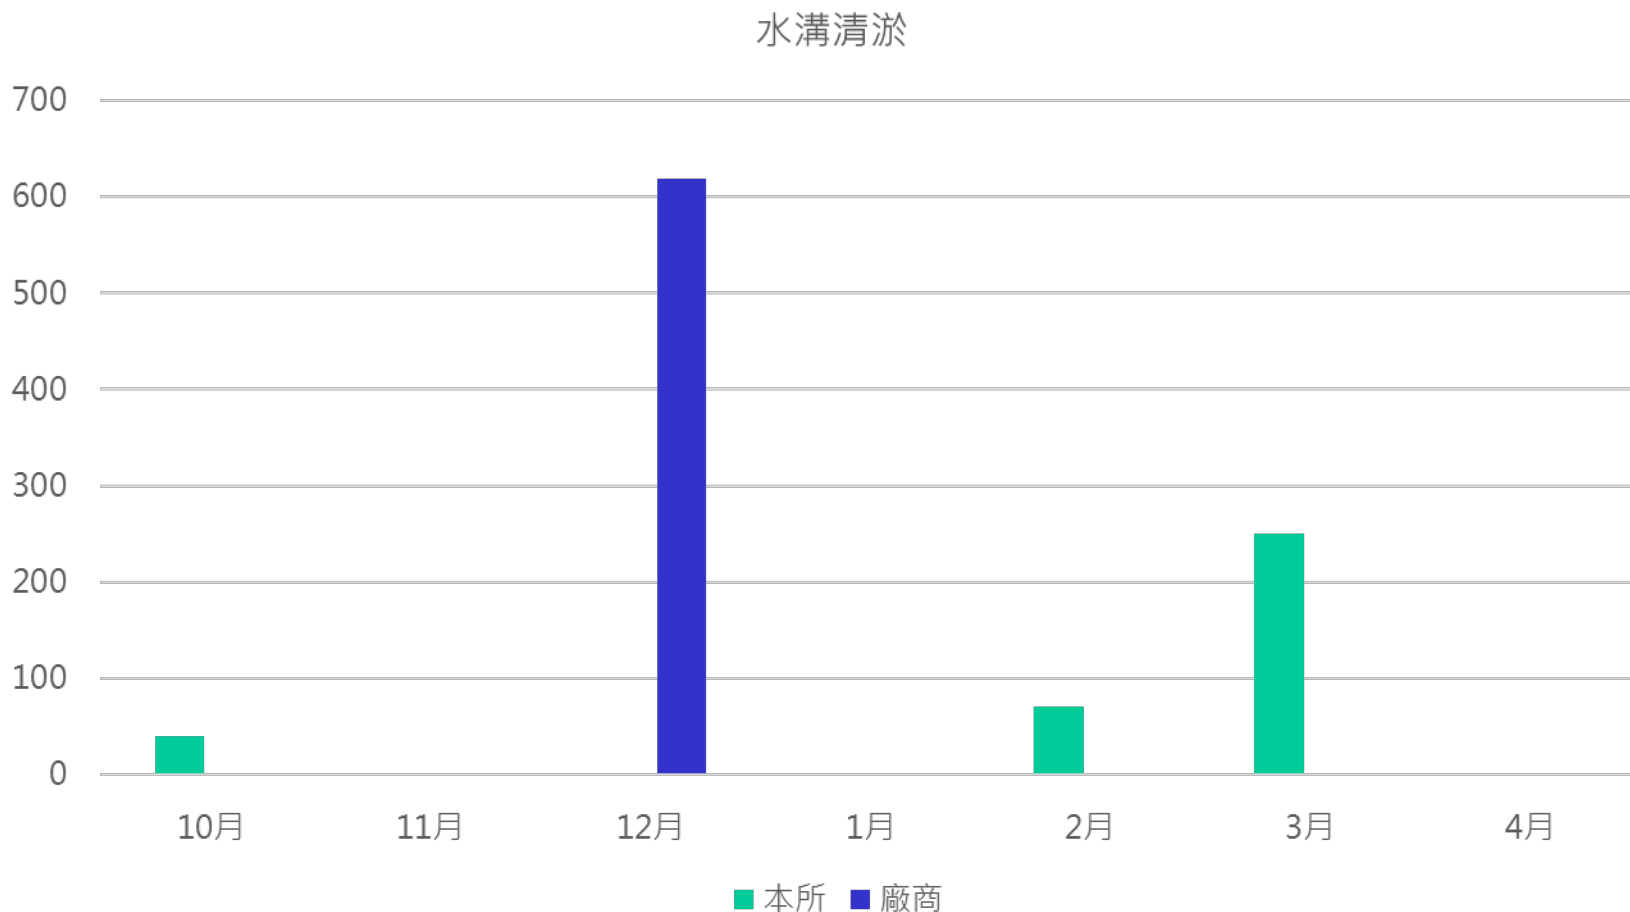



參、今後努力方向



今後努力方向 (1/2)

- 本處承辦（含代辦）工程案件，於辦理各階段設計成果審查時，除由品質科、工程科及企劃科分別派遣相關領域工程人員共同組成審查小組，並邀請相關單位參與；亦視實需依工程性質及規模量體，外聘專家學者及景觀總顧問協助本府共同辦理審查，以期達到適量設計、減少施工問題、方便管理維護之工程目標。工程施工階段落實施工查驗作業，並不定期辦理教育訓練，以加強承辦人本質學能。對於代辦案亦於啟案階段積極確認代辦單位需求內容，俾減少設計階段之需求變更，以增進設計作業。



今後努力方向 (2/2)

- 配合路平專案之執行，將以二面向及五要點為推動重點。二面向為「道路整建」及「道路維護」，五要點為「道路平整」、「不積水」、「孔蓋減量」、「路基堅實」及「不反覆開挖」等。在道路整建部分，各路段整建計畫將視道路規模及分工等條件，納入排水改善、人孔蓋下地、路基改良、道路高程重新設計、道路轉彎線型檢討及道路縱坡度檢討等，一併進行總體改善。並已就經常重覆修補、道路鋪面破壞嚴重之路段，建立道路整建計畫清單及量化評估指標。
- 賡續辦理地區公共工程品質查核及督導工作，以提昇工程品質。



肆、結語



肆、結語

本處擔負辦理本縣公共工程之業務，一切業務當本「工程品質第一、服務鄉親為上」之原則，朝建立制度化管理，充份溝通協調，加強培養專業人才，落實專業審查機制，提高作業效率努力。在有限人力下，仍當充份發揮團隊精神，努力創新、精益求精，戮力以赴，期使各工程如期如質完成



簡報完畢

恭請指導
