

金門縣議會第七屆第八次臨時會



109年度本縣各項重大工程計畫列管 (含決標金額、進度落後原因) 專案報告

報告人：行政處長 陳祥麟


中華民國109年8月17日

目次

- 一、計畫概況
- 二、截至109年7月止執行概況
- 三、落後原因檢討
- 四、本府管理措施
- 五、結語

一、計畫概況

- 109年度本縣新臺幣(以下同)5,000萬元以上重大工程列管計畫計26件，計畫總經費70億9,929萬元
- 計畫類別為5類：「港埠建設」、「道路及水利建設」、「公有建物及設施」、「城鄉及漁業建設」及「教育及體育設施」(詳圖1-1)

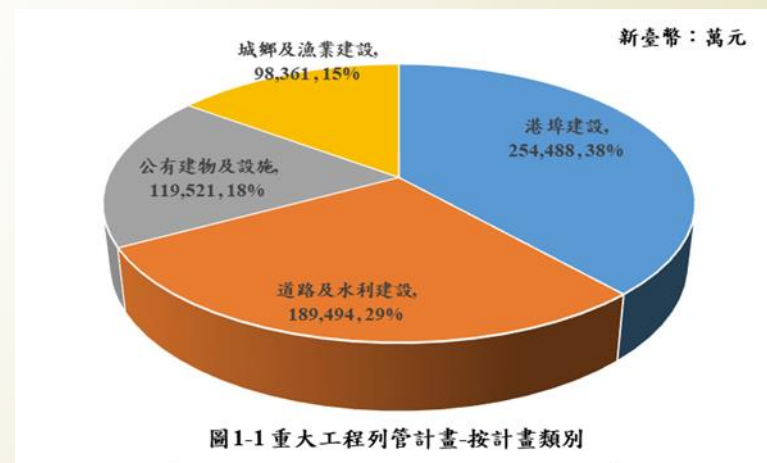

一、計畫概況(續)

- 按計畫執行單位別：港務處、工務處、金酒公司、建設處、自來水廠及教育處(詳圖1-2)
- 按計畫年度別，101年-108年計22件、109年度3件(詳圖1-3)

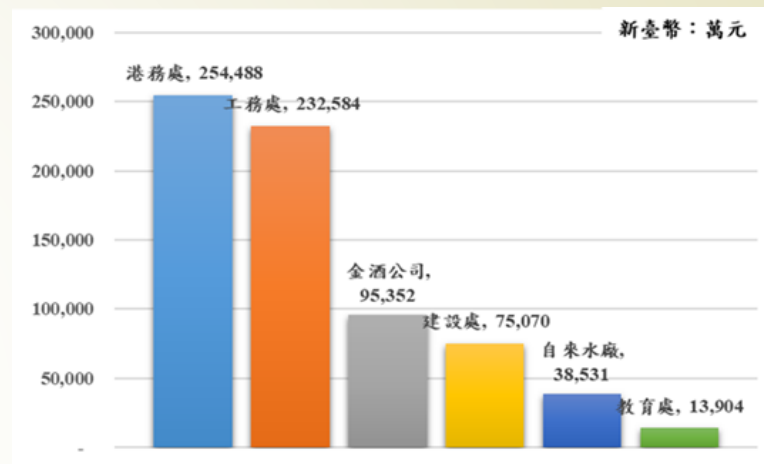


圖1-2 重大工程列管計畫-按單位別

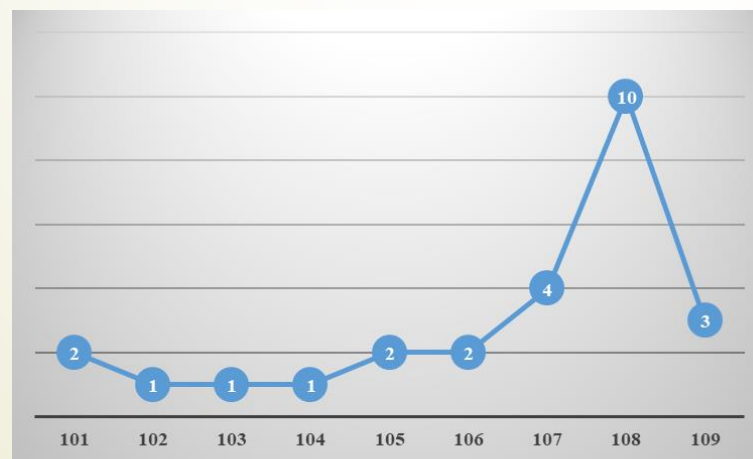


圖1-3 重大工程列管計畫-按年度別

二、截至109年7月止執行概況

- 落後進度**5%以下**計**6**件、**逾5%以上至10%**計**4**件、**逾10%以上至15%**計**4**件、**逾15%以上至20%**計**2**件(詳圖2-1)
- 按列管計畫類別，落後進度**逾10%**以上，為「港埠建設」、「城鄉及漁業建設」、「教育及體育設施」及「道路及水利建設」等(詳圖2-2)

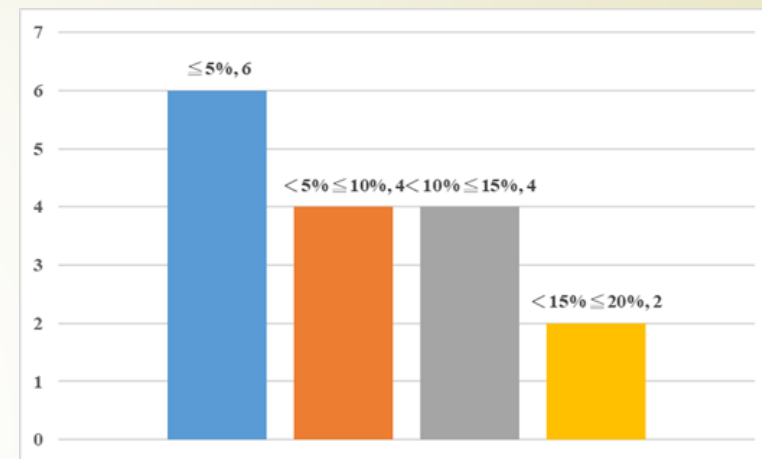


圖2-1 重大工程列管計畫落後計畫-按進度別

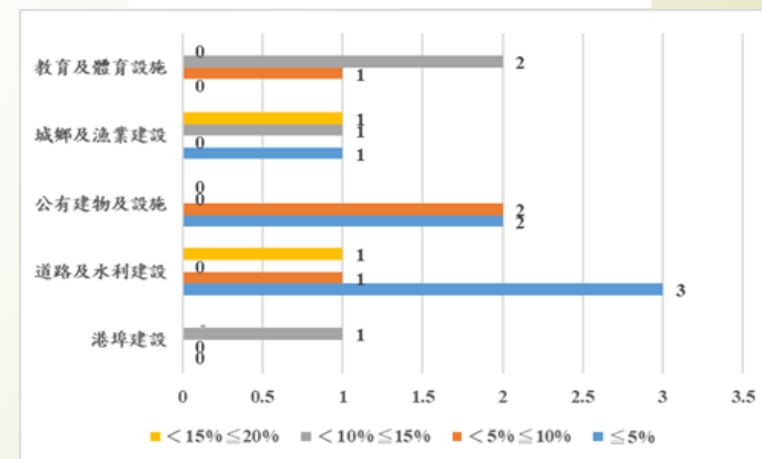


圖2-2 重大工程列管計畫落後進度-按計畫類別

二、截至109年7月止執行概況(續)

- 落後計畫按單位別，有「建設處」、「教育處」、「工務處」、「港務處」及「金酒公司」(如圖3)

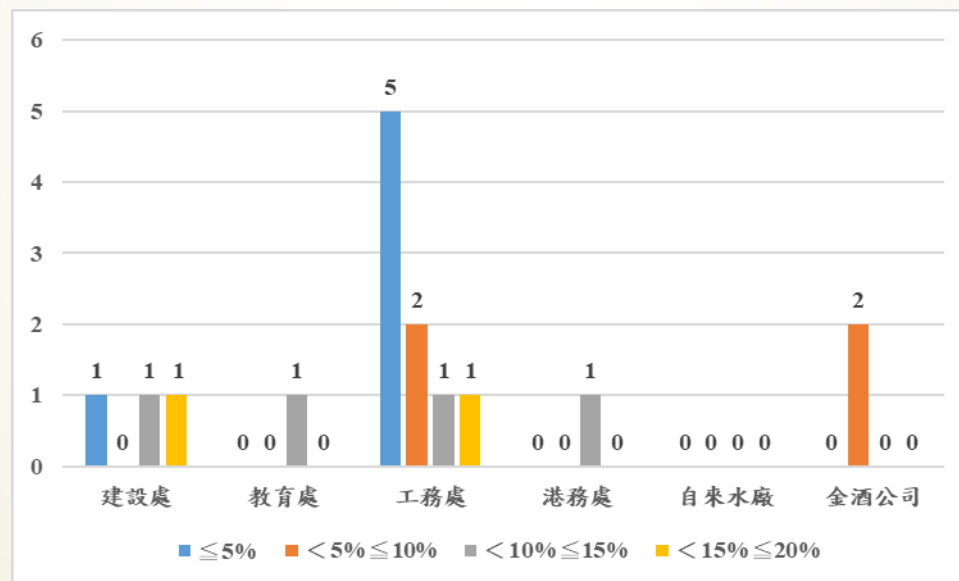


圖2-3 重大工程列管計畫落後進度-按單位別



二、截至109年7月止執行概況(續)

▶ 金門大橋建設計畫

- ◆ 工程執行概況：105年12月28日開工，預定110年5月6日完工，工期(含展期)1,591日曆天，截至本(109)年8月7日止，工程預定進度80.51%，實際進度77.18%，落後3.33%
- ◆ 經費編列與支用概況：截至本(109)年8月12日，78億5,636萬4,768元，已核撥經費71億6,449萬8,178元，實支66億8,193萬911元
- ◆ 管理措施：已列入行政院工程會公共建設督導會報與交通部重大工程督導會報定期進行管控及督導，另交通部國工局亦密集定期與不定期進行施工督導會報、安衛督導會報、施工檢討會議等，本府並將本工程納入重大政策暨計畫列管會議

三、落後原因檢討

- 「計畫落後」：實際進度未達預定進度或查核點進度落後
- 列管計畫26件中，計有16件落後，落後比率為61.54%
- 落後原因計有「廠商因素」、「施工因素」、「他案影響」、「天候因素」、「疫情影響」、「停工」、「土地問題」、「民眾抗爭」、「機關因素」及「其他」等(詳圖3-1、3-2)

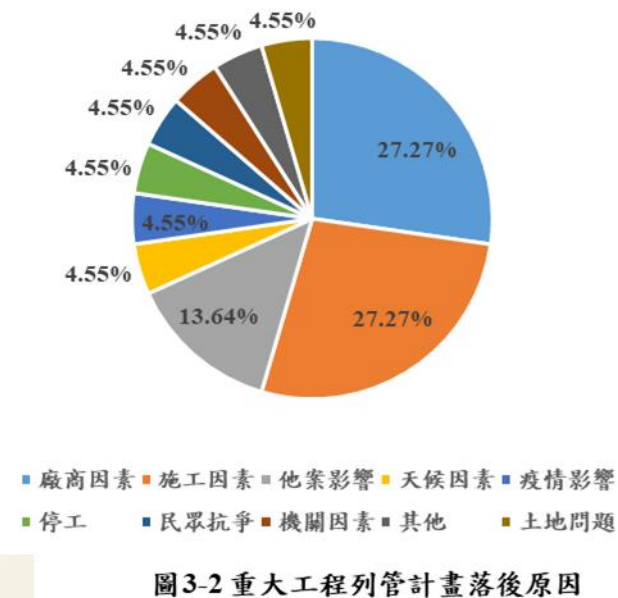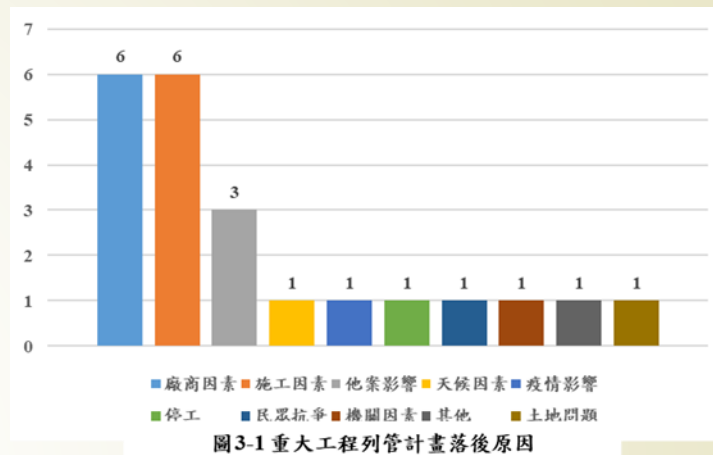

四、本府管理措施

- 定期召開「重大政策暨計畫列管會議」：本(109)年度召開4場次列管會議，4場次現場查核作業
- 定期召開「重大專案列管會議」：本(109)年度計召開10場次管考會議
- 定期召開全縣公共工程異常標案檢討會議：本(109)年度已召開3次檢討會議
- 召開施政計畫選項列管檢討會議：本(109)年度計召開2次檢討會，實地輔導訪視2場次

四、本府管理措施(續)

- ➡ 加強工程進度異常案件督導或查核：針對工程進度異常案件辦理督導或查核，本(109)年度已查核45件次
- ➡ 辦理「委託金門縣政府代辦工程前置作業程序」說明會議：於本(109)年7月9日，邀集本府與所屬一、二級機關及公營事業機構，辦理說明會議，了解相關作業程序與完善規劃需求計畫內容，以及前置作業注意事項，例如土地分區類別、用地取得、地質調查、交通狀況等

四、本府管理措施(續)

- 辦理施工查核常見缺失、設計審查常見缺失等教育訓練，建立良善履約管理機制：本(109)年度已辦理「公共工程規劃設計及品質管理實務講座」及「鋼筋、模板及混凝土施工職能訓練」等訓練，以強化工程主辦人員對於規劃設計、施工自主檢查與檢驗停留點檢驗等執行重點，同時培育地區工程人員專業技術核心職能，以提升地區公共工程品質

五、結語

本府將持續督促各計畫執行單位，依預定計畫期程，積極辦理，並提升公共工程施工品質，確保公共工程施工成果符合設計及規範的品質要求，以建構更好的生活環境品質。

恭請 指導
